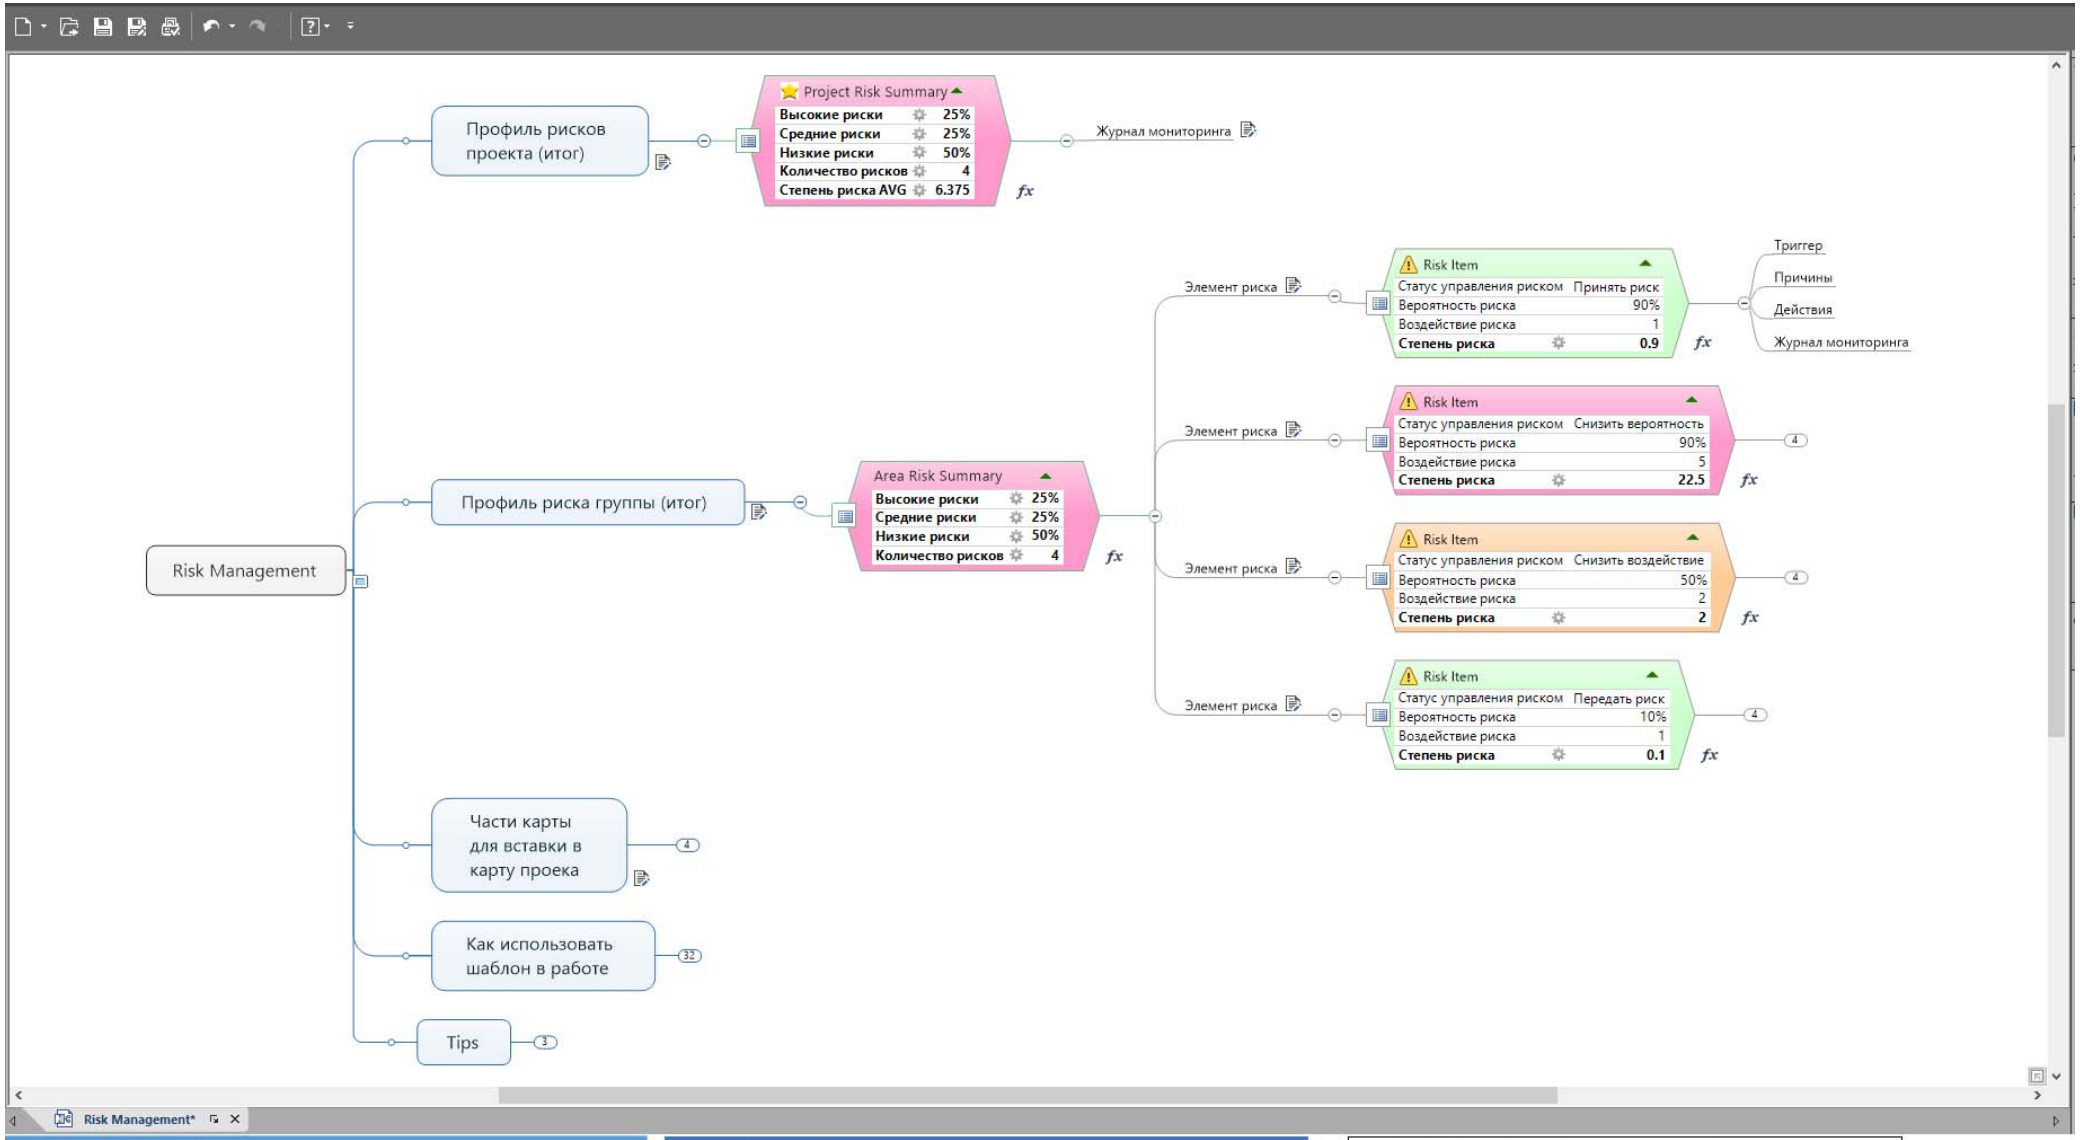

Вероятность	Проявление
0%	Не может быть - риск был устранен при проектировании
5%	Редкий, замеченный 1 раз в несколько лет
10% to 40%	Средний риск - наблюдается 1 раз в каждые несколько месяцев
50% to 80%	Высокий риск - наблюдается 1 раз каждые несколько недель
Over 80%	Почти определенно случится - можно ожидать, что это произойдет во время проекта

Влияние	Эффект
5	Может остановить проект
4	Вызывает значительные убытки, которые могут не поддаваться восстановлению и могут постоянно влиять на результат проекта
3	Вызывает убытки, которые потребуют дополнительных ресурсов для восстановления
2	Вызывает незначительные убытки, которые могут быть восстановлены путем перепланирования
1	Эффекты могут быть допущены и находятся в пределах проекта
0	Отсутствие влияния - риск был устранен по дизайну

Степень риска = Вероятность x Воздействие x Воздействие

Таблица рейтинга риска

	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
5	0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25
4	0	1.6	3.2	4.8	6.4	8	9.6	11.2	12.8	14.4	16
3	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	8.1	9
2	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4
1	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
